

Programme Régional d'Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle



Ulva Lactuca © RISE

TABLEAU DE BORD
Semestre 2 - 2023

SYNOPSIS DU PROGRAMME

Objectif

L'objectif du programme SANOI est de réduire la malnutrition et l'insécurité alimentaire dans la région de l'océan Indien, particulièrement pour les enfants âgés de 0 à 5 ans et les femmes enceintes.

Composantes du programme


1. Promouvoir des **pratiques agricoles durables et adaptées au changement climatique**
2. Accompagner la **diversification de l'alimentation** des populations vulnérables, dont les femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans, notamment à travers des campagnes de sensibilisation
3. Renforcer la **sécurité sanitaire** des produits agricoles au niveau régional
4. Améliorer l'**information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle** au niveau de chaque pays et au niveau régional

Résultats attendus

- Les compétences sur les pratiques agroécologiques, tenant en compte le changement climatique, sont renforcées au niveau de chaque pays et appliquées
- La relance d'une filière régionale de production de semences améliorées, adaptées au changement climatique est réalisée pour les productions agricoles prioritaires à l'échelle de la région
- Les groupes vulnérables diversifient leurs régimes alimentaires grâce aux connaissances et aux systèmes d'approvisionnement améliorés
- Les normes sanitaires et phytosanitaires sont renforcées et harmonisées dans la région
- Un réseau de laboratoires de contrôle de qualité et de surveillance dans les Etats de la COI est développé
- Les compétences des départements de statistique à collecter et diffuser de l'information fiable sur la sécurité alimentaire sont renforcées
- Un réseau informel régional sur la sécurité alimentaire est établi et pérennisé entre les différentes institutions qui agissent pour la sécurité alimentaire

Période de mise en œuvre

09 mars 2020 - 08 mars 2025 (5 ans)



Budget



Contribution des Etats Membres de la COI : 200 000 €

Contribution UE : 16 000 000 €

Financement Union européenne (11e Fonds Européen de Développement ACP-UE)

Photo de couverture : projet RISE, mis en œuvre par CISS / EPCO à Maurice : algue verte marine *Ulva Lactuca*

Actions en cours

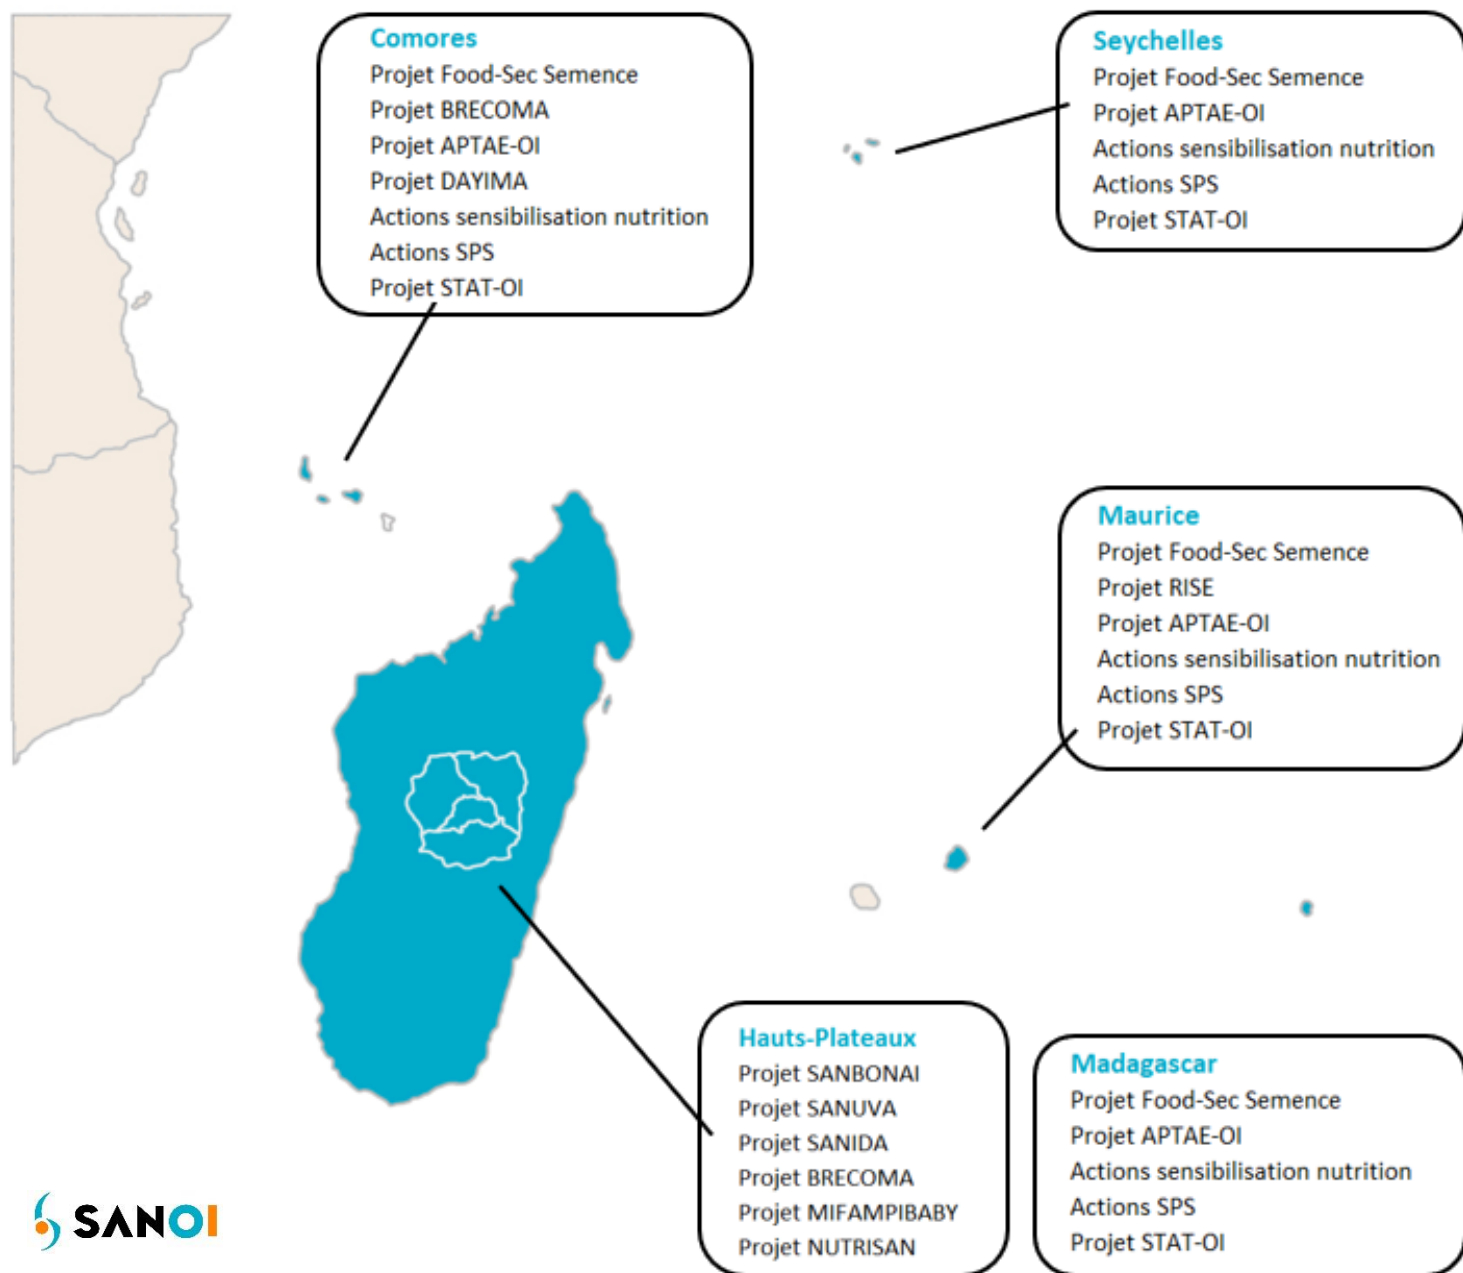



Comores



Madagascar



Maurice



Seychelles



Composante 1

Production agricole durable
(pratiques agricoles
durables et adaptées au
changement climatique)

SANBONAI

SANUVA

SANIDA

RISE

BRECOMA

APTAE-OI

Food-Sec Semence



Composante 2

Diversification de
l'alimentation

DAYIMA

MIFAMPIBABY

NUTRISAN

Action sensibilisation nutrition



Composante 3

Sécurité sanitaire et
phytosanitaire

Jumelage

Action SPS



Composante 4


Systèmes d'information
SAN

STAT-OI (FAO)




Gestion – mise en œuvre : faits marquants sur la période (juillet / décembre 2023)

Taux de réalisation de la **programmation 2023** de mise en œuvre du programme SANOI, telle que présentée et validée lors du dernier comité de pilotage (décembre 2022) – par composante **par rapport à la situation attendue à fin 2023**.

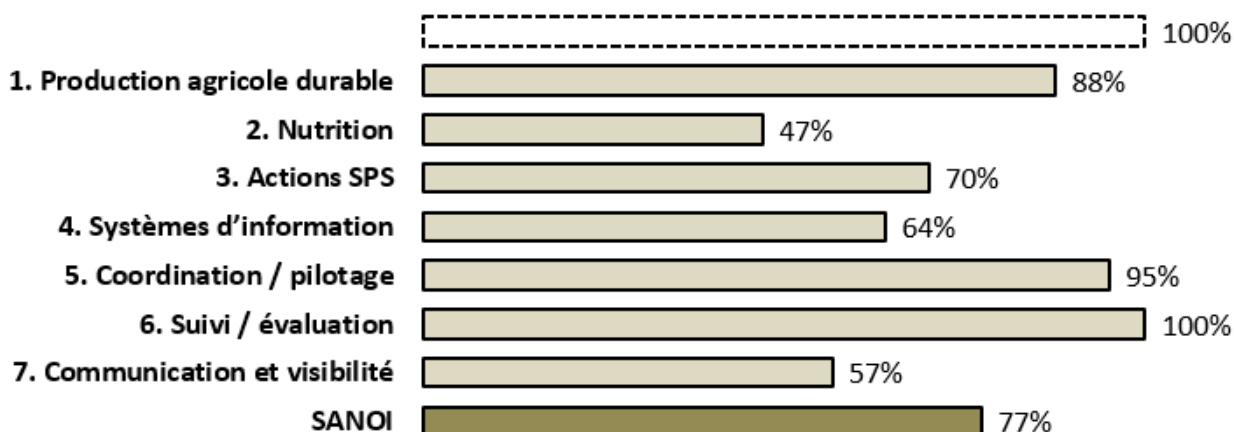

Le taux de réalisation global de la programmation 2023 est de 77 %. Les composantes qui ont les taux les plus faibles sont :

- Nutrition (47 %) : car une action de renforcement de la collecte de données sur la situation nutritionnelle aux Comores était souhaitée mais ne pourra aboutir + léger retard dans la mise en œuvre des actions de sensibilisation « nutrition » dans ce pays ;
- Systèmes d'information (64 %) : car les premiers rapports nationaux et régionaux annuels sur l'état de l'agriculture, la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région OI n'ont pas encore été produits ;
- Communication et visibilité (57 %) : car les événements et actions promotionnelles de grande envergure sont encore insuffisants.

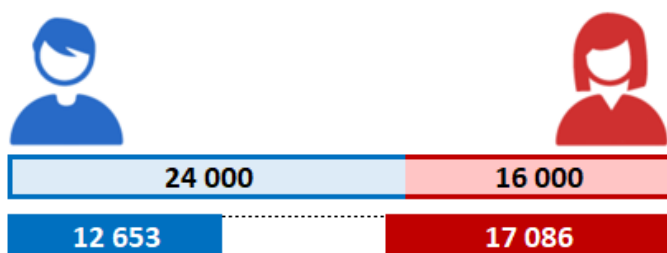

Nombres de bénéficiaires directs
Ciblés
Appuyés jusqu'à présent






Objectif spécifique 1 : Promouvoir des pratiques agricoles de qualité (intensification agroécologique économiquement durable, résiliente aux impacts du changement climatique et sensible à la nutrition, semences certifiées, lutte intégrée contre les ravageurs, etc.)

Actions en faveur de l'appui à la production et de la promotion des pratiques agroécologiques

- Six actions / projets (contrats de subvention) visant à « Augmenter et diversifier de façon durable et inclusive les productions agricoles » sont en cours. Il s'agit des actions suivantes :

Intitulé de l'action	Partenaires de mise en œuvre	Localisation	Durée	Budget (% SANOI)
Projet SANBONAI : Sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les régions Bongolava, Analamanga et Itasy	AFDI / ANAE / Réseau SOA	Analamanga, Bongolava et Itasy - Madagascar	40 mois	1.280.097 € (8,0 %)
Projet SANUVA : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des ménages agricoles dans la Région du Vakinankaratra	Agrisud / AVSF / APDRA / GSDM	Vakinankaratra - Madagascar	40 mois	1.500.000 € (9,4 %)
Projet SANIDA : Sécurité Alimentaire et Nutrition par l'Intensification et la Diversification Agroécologiques	AKF / OSDRM / PAM	Analamanga, Itasy et Vakinankaratra - Madagascar	36 mois	1.350.000 € (8,4 %)
Projet BRECOMA : Building Resilience to Enhance Food, Incomes and Nutrition Security in the Comoros and Madagascar	IITA / AfricaRice	Ngadzija, Ndzhouani et Mwali - Comores Vakinankatra, Analamanga and Itasy - Madagascar	36 mois	1.335.000 € (8,3 %)
Projet RISE : Resilient Island Endeavour : the application of a seaweed-based multipurpose agricultural system to combat the effects of climate change in Mauritius	CISS / EPCO	10 villages de la côte Sud-Est (Grand Port District) - Maurice	24 mois	299.250 € (1,9 %)
Projet APTAE-OI : Appropriation des Pratiques pour la Transition Agro-Ecologique dans le sud-ouest de l'océan Indien	Cirad / Vélo Vert / MCA	Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles	24 mois	499.932 € (3,1 %)

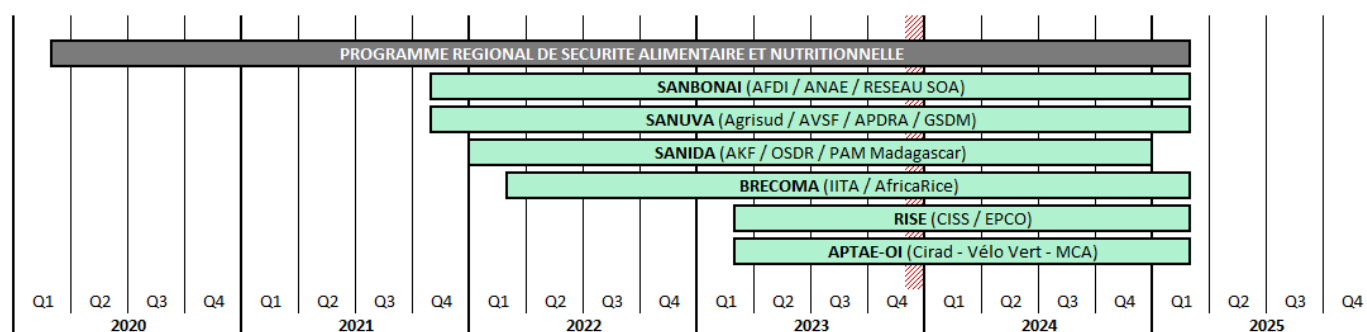


- Les projets de proximité à Madagascar poursuivent leur grande diversité d'activités :
 - L'appui aux organisations paysannes en matière d'intensification agroécologique
 - L'intensification du réseau de prestataires de proximité (techniciens, formateurs locaux, paysans relais...)
 - Mise en place de Groupement d'Epargne et de Crédit, avec alphabétisation et digitalisation financière
 - L'accompagnement à la valorisation post-récolte des productions
 - Production d'arbres fruitiers et forestiers, et reboisement
 - Elaboration de référentiels techniques
 - Appui conseil, formation et suivi de paysans multiplicateurs de semences
 - Introduction de nouvelles variétés à haute valeur nutritive
 - Développement de services pour l'installation des jeunes
 - Appui à la transformation (ex. 2 unités d'étuvage modernes du riz installées)
 - Appui à la commercialisation et réflexion sur la démarche contrôle qualité en interne (SPG) des produits maraichers
 - Accompagnement des agents communautaires nutrition, formation et dans la mise en place de sites vitrines et de jardins potagers
 - Des animations communautaires en coaching et suivi nutritionnel, qui font le lien entre les sources d'alimentation (production agricole, marché, gestion des ressources naturelles) et la nutrition

Situation détaillée par projet disponible si nécessaire.

- Le projet BRECOMA poursuit également ses activités aux Comores :
 - Introduction, évaluation, sélection de quatre variétés de maïs et deux de manioc jaune
 - Multiplication et distribution de la patate douce à chair orange
 - Sensibilisation sur les produits à haute valeur nutritionnelle
- A Maurice, le projet RISE a réalisé des sessions d'introduction dans les 10 villages ciblés (138 personnes touchées). 9 ateliers sur le changement climatique et l'agriculture durable y ont été menés. Le projet RISE a construit un radeau pilote en bambou destiné à produire des échantillons d'algues qui seront testés pour vérifier leurs propriétés pour transformation en biofertilisant et pour mesurer le taux de croissance de l'algue.
- 29.739 petits exploitants bénéficiant d'interventions soutenues par la composante 1 du programme (dont 57 % de femmes).
- Un premier atelier régional du projet APTAE-OI a été organisé à La Réunion (septembre 2023). Cet atelier a réuni 60 personnes venant des pays de la COI et de la France Hexagonale pour inventorier et partager les connaissances sur les pratiques agroécologiques dans une diversité de systèmes de culture, sur les expériences de certification des produits, sur les méthodes d'évaluation multicritères des pratiques et sur les outils de capitalisation et de transfert des savoirs dont les vidéos et les outils numériques.
 - Une première liste des pratiques agroécologiques mises en œuvre dans l'OI a été dressée et une première base de données est en co-construction.
 - Une première liste des initiatives de certification sur les territoires du projet a été dressée.
 - Un cahier des charges du format des capsules vidéo et un calendrier de diffusion ont été validés : une première capsule sera produite d'ici fin 2023.

Action d'appui à la relance d'une filière semencière au niveau régional

Intitulé de l'action	Partenaires de mise en œuvre	Localisation	Durée	Budget (% SANOI)
Projet Food-Sec Semence : Relance d'une filière régionale de semences et plants certifiés, adaptés au changement climatique pour les productions agricoles à des fins alimentaires et nutritionnelles	Cirad / FOFIFA / FAREI	Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles	50 mois	1.999.254 € (12,5 %)



- Les ateliers de restitution des résultats des analyses filières ont été réalisés dans les 4 pays (activité 1 terminée).
- Un atelier régional sur les aspects réglementaires de l'inscription des variétés au catalogue et de la certification des semences s'est tenu en juillet 2023 à Antsirabe - Madagascar.
- Le Cycle 1 de descriptions DHS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) a été validé à Madagascar et à Maurice, permettant d'espérer l'inscription de variétés au catalogue d'ici la fin du projet.
- Une serre a été livrée au FAREI à Maurice pour la production de minitubercules de pommes de terre exempts de maladies.
- La livraison des appareils LAMP de diagnostic rapide des maladies est terminée, et des formations ont été réalisées à Maurice, Madagascar et aux Comores) pour les 2 maladies pour lesquelles les tests sont déjà au point.
- La production de semences à ce stade est globalement satisfaisante. Le nombre de variétés produites s'approche de la cible visée, sauf pour les maniocs non encore produits aux Comores. On notera les premières grosses récoltes de maïs à Madagascar (16 tonnes) et de pomme de terre à Maurice (4 tonnes).
- Les premiers essais agroécologiques ont été lancés dans les 4 pays. De très bons résultats sont enregistrés pour l'adaptation de la variété de pomme de terre Vigora en condition de faibles intrants à Madagascar et aux Comores.



N°	Indicateur	Cible 2023	Valeurs Sem2 2023	Source	
Indicateurs d'effet					
5	Nombre de petits exploitants adoptant des pratiques agricoles promues par le programme	Ho : 11 611 Fe : 7 740	Ho : 2 558 Fe : 6 008	Rapports de résultats des opérateurs	■
6	Augmentation des rendements des spéculations cibles soutenues par le programme	+ 10 %	Madagascar : Riz irr. : 4,1 t/ha Riz Pluv. : 2,8 t/ha Maïs : 2,0 t/ha Manioc : 6,3 t/ha	Recherche évaluative facilitée par NRF Résultats du premier cycle d'enquêtes	
9	Nombre de structures de productions de semences améliorées appuyées par le programme	COM : 2 MAD : 2 MRU : 1 SEY : 1	COM : 2 MAD : 2 MRU : 1 SEY : 1	CIRAD – projet Food-Sec Semence	■
Indicateurs de produit					
19	Nombre de parcelles expérimentales de pratiques agro écologiques établies par pays	COM : 3 MAD : 4 MRU : 2 SEY : 2	COM : 3 MAD : 4 MRU : 3 SEY : 2	CIRAD – projet Food-Sec Semence	■
20	Nombre de petits exploitants bénéficiant d'interventions soutenues par l'UE visant à accroître leur production durable, leur accès aux marchés et/ou la sécurité des terres	Ho : 19 428 Fe : 12 952	Ho : 12 653 Fe : 17 086	Rapports de résultats des opérateurs	■
22	Nombre d'acteurs appuyés par le programme renforcés aux technologies de production des semences améliorées	COM : 3 MAD : 4 MRU : 2 SEY : 1	COM : 3 MAD : 4 MRU : 2 SEY : 0	CIRAD – projet Food-Sec Semence	■
23	Nombre de variétés pour lesquelles des clones, tubercules ou semence sains et conformes sont produits avec l'appui du programme	23	26	CIRAD – projet Food-Sec Semence	■
24	Quantité de semences améliorées produites avec l'appui du programme	Manioc : 4 400 bout. Pdt : 6 800 kg Maïs : 6 300 kg Lég. : 3 160 kg	Manioc : 6 388 bout. Pdt : 21 284 kg Maïs : 17 472 kg Lég. : 4 472 kg	CIRAD – projet Food-Sec Semence	■

Légende des tableaux : N/D : Non disponible N/A : Non applicable

■ Dans le temps / En avance sur le planning ■ En léger retard ■ Retard important






Objectif spécifique 2 : Sensibiliser à et accompagner la diversification de l'alimentation des populations vulnérables (en particulier les femmes enceintes et enfants de moins de 5 ans)

- Trois contrats de subvention visant à « l'amélioration de la situation nutritionnelle / diversification alimentaire » ainsi qu'une Assistance Technique pour la mise en œuvre d'activités thématiques et transversales nutrition sont en cours.

Intitulé de l'action	Partenaires de mise en œuvre	Localisation	Durée	Budget (% SANOI)
Projet MIFAMPIBABY : Appui à la prévention du retard de croissance dans les régions rurales d'Analamanga, Bongolava et Itasy	ACF / AIM	Analamanga, Bongolava et Itasy - Madagascar	40 mois	600.000 € (3,8 %)
Projet NUTRISAN : Contribuer à réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans vivant en zone rurale à Madagascar	Santé Sud	Analamanga - Madagascar	36 mois	591.300 € (3,7 %)
Projet DAYIMA : Appui à la promotion des modes nutritionnels sains par l'intégration du numérique et la participation des adolescents en Union des Comores	DAYIMA / Moina Mche Djawu	Grande Comore, Anjouan et Mohéli - Comores	24 mois	150.000 € (0,9 %)
AT - Appui à la mise en œuvre d'actions de sensibilisation sur les bonnes pratiques de nutrition	Consortium CAPA / AETS	Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles	23 mois	PM

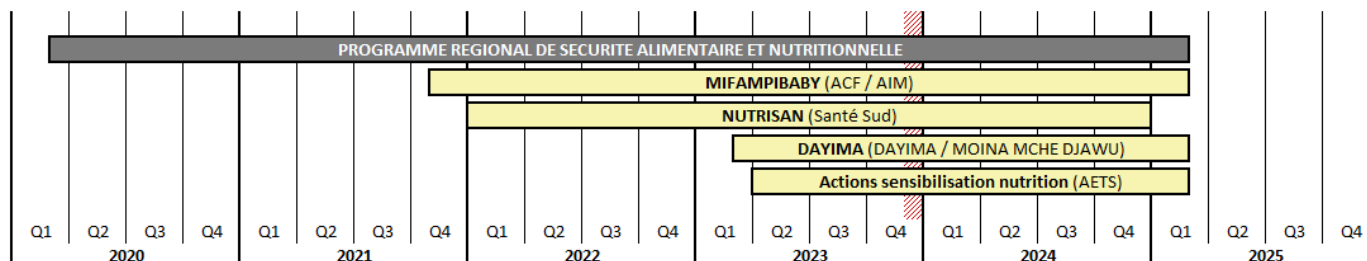

- Madagascar : les deux projets poursuivent actuellement leur activité de sensibilisation aux bonnes pratiques alimentaires dans 27 communes de Madagascar. De nombreuses sensibilisations / formations des partenaires de mise en œuvre (sage-femmes, agents communautaires, jeunes pairs éducateurs) ont été réalisées et ceux-ci ont à leur tour entamé les actions de sensibilisation des femmes et les animations villageoises
- 33 Care groups ont été mis en place par le projet MIFAMPIBABY, qui conduisent des activités de changement de comportement au niveau communautaire et dans les écoles. Le projet NUTRISAN est passé à la phase d'extension des activités de sensibilisation à travers différentes approches, entre autres les visites à domicile, les ateliers, les discussions de groupe et les sensibilisations de masse. Au total, plus de 15.000 femmes ont déjà été sensibilisées à l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant âgés de 0 à 5 ans. Les communautés commencent à produire une alimentation de complément pour le jeune enfant à base des ressources disponibles localement.

- Comores : le projet DAYIMA a débuté en mars 2023. Les sensibilisations / formations de 250 femmes et 600 adolescents ont été initiées dans les zones du projet. Des modules de formations culinaires et une application numérique montrant diverses recettes à travers des innovations culinaires à base de produits locaux ont été développés.
- L'assistance technique (AT CAPA) a élaboré une note conceptuelle pour la mise en place d'initiatives complémentaires de communication et sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles, sur base des priorités exprimées par les différentes parties prenantes. Une première campagne de communication et sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles a été conçue aux Comores, en concertation avec le ministère de la Santé et en appui à l'UNICEF, l'INRAPE et l'ONG DAYIMA. L'expert en nutrition a participé à la préparation et à la finalisation de 4 supports de communication :
 - Un livret sur la promotion de l'allaitement maternel (UNICEF) ;
 - Un « flyer » sur les bonnes pratiques d'hygiène en alimentation (INRAPE) ;
 - Un « flyer » destiné à communiquer sur l'importance de certains micronutriments (INRAPE) ;
 - Un document de synthèse sur les principales sources en micronutriments (UNICEF).
- Des contacts ont été initiés pour étudier les possibilités de développer un dispositif complémentaire de collecte de données sur la situation nutritionnelle des populations aux Comores, mais n'ont pas abouti par manque de réactivité des partenaires locaux.

N°	Indicateur	Cible	Valeurs Sem2 2023	Source	
Indicateurs d'effet					
12	Proportion de femmes enceintes ciblées par le programme ayant accès à une alimentation variée, riche en fer, en protéines et en vitamines	MAD : 25,3 % (2025)	MAD : 22 %	Recherche évaluative facilitée par NRF Résultats du premier cycle d'enquêtes	
13	Proportion d'enfants de moins de 2 ans ciblés par le programme ayant accès à une alimentation variée, riche en fer, en protéines et en vitamines	MAD : 17,4 % (2025)	MAD : 13,9 %		
Indicateurs de produit					
26	Nombre de femmes sensibilisées à l'amélioration de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant âgés de 0 à 5 ans (ANJE) dans le cadre du programme	COM : 1 800 MAD : 25 734 (2023)	COM : 1 177 MAD : 23 474	Rapports d'avancement des projets partenaires	

Légende des tableaux : N/D : Non disponible N/A : Non applicable


■ Dans le temps / En avance sur le planning ■ En léger retard ■ Retard important





Objectif spécifique 3 : Renforcer la sûreté alimentaire et la sécurité sanitaire au niveau régional

Intitulé de l'action	Partenaires de mise en œuvre	Localisation	Durée	Budget (% SANOI)
Projet Jumelage : Appui au renforcement du dispositif de surveillance et contrôle de la qualité et de la conformité sanitaire / phytosanitaire des produits agricoles et agroalimentaires de Madagascar	France / Italie / MINAE	Madagascar	24 mois + 6 mois	1.946.150 € (12,1 %)
AT - Appui à la mise en œuvre d'actions de renforcement des capacités des pays bénéficiaires dans le domaine sanitaire et phytosanitaire (SPS)	Consortium CAPA / AETS	Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles	23 mois	650.000 € (4,1 %)



Renforcement institutionnel en matière SPS : Jumelage Madagascar

- Le projet Jumelage SPS entre les administrations française, italienne et malgache a démarré en septembre 2022 pour le renforcement du dispositif de surveillance et de contrôle de la qualité et conformité SPS des produits agricoles et agroalimentaires à Madagascar.
- Deux réunions du comité de pilotage (COPIL) se sont tenues durant cette période de référence (juillet et octobre 2023).
- Lors du COPIL d'avril 2023, les trois chefs de projet (français, italienne et malgache) avaient souligné le retard pris dans la mise en œuvre du plan de travail initial (en partie imputable au manque de disponibilité des experts et des agents de l'administration bénéficiaire et car l'outil de coopération « Jumelage » est nouveau pour cette zone géographique). Ce retard est en train de se résorber peu à peu : démarrage de la 2ème année d'exercice avec une augmentation du rythme des activités.
- Au moins une mission a été organisée pour chacun des 5 volets et des missions conjointes ont été organisées entre plusieurs volets.
- Le projet a organisé des missions délocalisées faisant intervenir les services régionaux en plus de l'échelon central.
- L'équipe malgache du volet 5 (Communication et intégration régionale) a été renforcée avec l'aide du programme RINDRA (UE).
- Détails des missions effectuées depuis le début du jumelage :
 - volet 1 (Cadre législatif et réglementaire) : 5 formations à distance ou e-expertise – 4 missions à Madagascar – 1 voyage d'étude en Europe
 - volet 2 (Amélioration du fonctionnement interne des services) : 1 formation à distance ou e-expertise – 2 missions à Madagascar

- volet 3 (Capacités surveillance SPS) : 1 formations à distance ou e-expertise – 3 missions à Madagascar
- volet 4 (Systèmes d'information SPS) : 2 missions à Madagascar
- Etant donné le retard accumulé dans la réalisation des différentes missions, une proposition d'ajustement des activités, de certains indicateurs et des moyens pour atteindre les résultats a été présentée et validée. Un avenant, prévoyant également une prolongation de 6 mois du contrat, est en cours de signature.

Renforcement institutionnel en matière SPS : autres activités de renforcement institutionnel

- Deux missions préalables d'évaluation des risques sur les filières prioritaires d'intervention « volaille » et « maïs » ont été préconisées. La première mission (volaille) est prévue début décembre 2023 (à Madagascar et à Maurice, avec contacts à distance pour Comores et Seychelles).
- Un séminaire régional comportant des séquences de formation et des séquences de discussions / débat entre représentants des états de la COI sur les mesures à prendre pour renforcer les mesures SPS dans la région était programmé initialement en novembre 2023 à Madagascar. Ce séminaire a été reporté à février 2024.
- Des contacts ont été établis avec le projet Jumelage dans le but de coordonner les actions des deux projets. Une partie du séminaire régional de février 2024 à Madagascar inclura des séances de travail conjointes entre les deux projets.
- L'Expert en contrôles SPS aux frontières a été impliqué dans les activités de réflexion stratégiques destinées à proposer un plan d'intervention et à la préparation des activités à venir.

Appui aux laboratoires

- L'assistance technique a animé un premier atelier régional de 3 jours à Maurice (juin 2023) sur les politiques et le renforcement des laboratoires. Cet atelier a permis de produire les résultats suivants :
 - Un annuaire des principaux laboratoires impliqué dans les analyses relatives à la sécurité sanitaire des aliments
 - Une cartographie détaillée des laboratoires qui indique quelles capacités d'analyses sont installées dans la région ;
 - Une analyse des forces et faiblesses du réseau de laboratoires formé par les 14 unités ayant participé à l'atelier ;
 - Un plan d'actions pour l'assistance technique ;
 - Des orientations stratégiques pour une politique régionale de laboratoires ;
 - Des éléments de réflexion sur la mise en place d'un réseau regroupant les 14 laboratoires présents ;
 - Un calendrier prévisionnel d'activités sur la composante laboratoire.
- Les consultants ont travaillé à la préparation des missions d'appui envisagées dans le plan de travail établi suite à l'atelier :
 - Une mission d'appui technique aux laboratoires de contrôle alimentaire à Madagascar réalisée du 23 octobre au 03 novembre 2023 ;
 - Les termes de référence pour trois missions de formation (détection de l'arsenic dans les produits de la pêche, détection des résidus de pesticides et CCC) ont été élaborés et une demande d'appui via l'instrument TAIEX a été introduite. Les deux premières formations devraient intervenir au 1^{er} trimestre 2024 (à Maurice et aux Seychelles), au profit du personnel de différents laboratoires de la région (formations régionales).

N°	Indicateur	Cible 2025	Valeurs Sem2 2023	Source	
Indicateurs d'effet					
16	Nombre de laboratoires accrédités ISO 10725 pour la détection des principaux contaminants dans les produits alimentaires	4	2	Projet SPS	■
Indicateurs de produit					
27	Nombre d'autorités compétentes ayant bénéficié d'appuis en matière de renforcement et harmonisation des normes SPS	COM : 1 MAD : 3 MRU : 1 SEY : 1	COM : 0 MAD : 3 MRU : 0 SEY : 0	Jumelage et Projet SPS	■
28	Nombre de laboratoires ayant renforcé leurs capacités (compétences, équipements...)	COM : 1 MAD : 1 MRU : 1 SEY : 1	COM : 1 MAD : 6 MRU : 6 SEY : 2		■
29	Existence d'un protocole d'accord signés pour la mise en réseau de laboratoires dans la région	OUI	NON		■

Légende des tableaux : N/D : Non disponible N/A : Non applicable


■ Dans le temps / En avance sur le planning ■ En léger retard ■ Retard important





Objectif spécifique 4 : Améliorer l'information des États sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans chaque pays

Intitulé de l'action	Partenaires de mise en œuvre	Localisation	Durée	Budget (% SANOI)
Projet STAT-OI : Mise en place d'un réseau de systèmes d'informations sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les îles de l'Océan Indien	FAO	Madagascar, Comores, Maurice et Seychelles	46 mois	2.000.000 € (12,5 %)



- Le projet « Mise en place d'un réseau de systèmes d'informations sur l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les îles de l'Océan Indien » confié à la FAO travaille pour combler le retard encouru suite aux délais de recrutement des experts nationaux et du coordonnateur régional.
- Les rapports nationaux d'états de lieu des systèmes d'information existants et des données disponibles sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les 4 pays et le rapport d'évaluation comparative des besoins régionaux ont été diffusés (juillet 2023).
- Le rapport de l'enquête « Productions agricoles TCP 2021 aux Comores » a fait l'objet d'une présentation nationale en juillet et les résultats ont été validés. La publication du rapport se fera dès validation par la Direction Nationale de la Stratégie Agricole et de l'Élevage. La 2ème enquête nationale sur les productions agricoles et la SAN est en cours.
- Des Task Forces nationales ont été mises en place. Elles sont composées des représentants des institutions nationales partenaires du projet. Ces 4 Task Forces ont initié les travaux pour compiler et valider les données à publier. L'ancrage institutionnel doit encore être précisé pour certaines Task Forces.
- Les bulletins nationaux sur la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle sont en cours de préparation. Une première note technique est prévue pour Madagascar fin 2023. Une note synthétique sur les résultats de l'enquête « Productions agricoles TCP 2021 aux Comores », ainsi qu'une première note régionale sont attendues pour début 2024.
- Des activités de renforcement des capacités nationales sont en cours :
 - Comores : renforcement en cours dans le cadre de la nouvelle collecte pour actualisation de l'enquête « Productions agricoles TCP 2021 » ;
 - Madagascar : appui pour la collecte et la gestion informatique de données en prévision du prochain recensement de l'Agriculture ;
 - Maurice : formations SIG pour le FAREI déjà réalisées (27 participants). Des formations du personnel de Statistic Mauritius sont prévues sous peu dans le cadre de l'appui FAO à la réalisation du recensement de l'Agriculture.
- Le projet envisage d'appuyer un dispositif régulier de collecte des prix agricoles sur les 3 îles des Comores.
- L'appel d'offre restreint pour le développement des plateformes de partage d'information a été préparé et sera lancé d'ici la fin de l'année. La première plateforme sera développée à Maurice à partir de 2024.

N°	Indicateur	Cible 2025	Valeurs Sem2 2023	Source	
Indicateurs d'effet					
17	Nombre de pays de l'océan Indien dotés de systèmes d'information fonctionnels et plus efficaces sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle	4	0	FAO – projet « Mise en place d'un réseau de systèmes d'informations »	
Indicateurs de produit					
32	Nombre de pays dotés de plateformes nationales renforcées et opérationnelles	4	0	FAO – projet « Mise en place d'un réseau de systèmes d'informations »	
33	Nombre de personnes formées à la collecte, au traitement et à la diffusion d'information avec une évaluation positive	40	COM : 68 (21 Fe) MRU : 27 (11 Fe)		
34	Nombre de pays participant au Comité stratégique régional sur la sécurité alimentaire et contribuant avec les données et informations nécessaires à la plateforme de dialogue régional	4	0		

Légende des tableaux : N/D : Non disponible N/A : Non applicable

 Dans le temps / En avance sur le planning  En léger retard  Retard important

Coordination, pilotage, suivi-évaluation

- Une note de synthèse sur l'état de mise en œuvre du programme SANOI a été produite et transmise à la COI et à l'ensemble des partenaires. Cette note récapitule et présente brièvement les 13 contrats de mise en œuvre des actions du programme.
- Le rapport du premier cycle de recherche évaluative (baseline sur base des enquêtes de terrain menées entre octobre et novembre 2022 à Madagascar par NRF) a été validé et diffusé (septembre 2023).
- Une méthodologie simplifiée de mesure de l'autonomisation des femmes, combinant questionnaire quantitatif et enquête qualitative, a été mise au point par NRF.
- Un accompagnement rapproché a été fourni aux opérateurs, en particulier pour les contrats récents (projets APTAE-OI, DAYIMA, RISE) et pour les actions à mettre en œuvre dans le cadre du contrat CAPA.
- L'Assistant technique a réalisé une mission de suivi / coordination à Madagascar, du 07 au 12 octobre 2023, et une mission de suivi / coordination aux Seychelles est programmée du 06 au 09 décembre 2023.
- L'Assistant technique a pris part au premier atelier régional technique et scientifique du projet APTAE-OI, qui s'est tenu du 06 au 08 septembre 2023 au pôle 3P du Cirad à Saint Pierre, à La Réunion.
- La 3^{ème} réunion annuelle du Comité de Suivi Opérationnel du programme s'est tenue à Maurice le 1 décembre 2023, avec organisation d'une journée thématique sur la valorisation des produits locaux (nutrition) et visites des réalisations sur le terrain.

Activités transversales, échanges d'expériences



- Afin de promouvoir le partage de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques au sein des pays de l'océan Indien, trois ateliers SANOI ont réuni les opérateurs et partenaires du programme sur les thématiques suivantes :

- Un atelier conjoint AFAFI – Centre / SANOI sur « Echanges et partages d'expériences sur les stratégies de commercialisation et de valorisation des produits frais agroécologiques pour le marché local dans les Hautes-Terres centrales », tenu à Antananarivo (Madagascar) le 25 juillet 2023.
- Un atelier régional sur les aspects réglementaires de l'inscription des variétés au catalogue et de la certification des semences, tenu à Antsirabe (Madagascar) du 26 au 28 juillet 2023.
- Un atelier sur le thème de « La promotion de l'équité de genre et l'autonomisation des femmes dans la transition agroécologique », tenu à Antananarivo (Madagascar) le 09 octobre 2023. Les présentations PPT de l'atelier sont accessibles sur le site d'équipe SANOI.

Communication interne et externe

- La communication externe sur les actions est assurée via les médias COI / DUE, les sites internet des projets et divers communiqués de presse, couvrant notamment des événements publics tels que la participation à des foires, l'organisation d'ateliers ou de formations ou de cérémonies de lancement officiel... De nombreux posts ont été publiés sur les réseaux sociaux à l'occasion des événements organisés (cérémonies de lancements, réunions de comités de pilotage, formations, ateliers thématiques, visites d'échanges, célébration de journées internationales en lien avec les thématiques couvertes par le programme).
- Un annuaire / répertoire du personnel des projets SANOI (trombinoscope) a été finalisé et partagé avec tous les partenaires (version 1 en août 2023, version 2 actualisée en septembre 2023).
- La visibilité du programme et du partenariat COI / UE est assurée à travers des produits tels que roll-ups, affiches, polos / casquettes, et autres accessoires promotionnels (stylos, gourdes, clés USB...).

Suivi financier

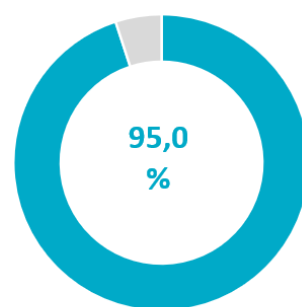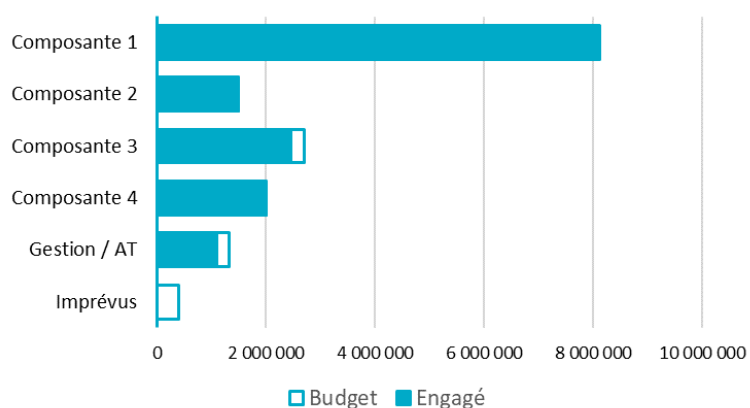

Taux d'engagement

- Le taux d'engagement (contractualisation) au 30 novembre 2023 est de 94,98 %. Le reste à contracter correspond aux imprévus (405.000 €), aux audits et évaluations (200.000 €) et aux fonds qui n'ont pu être engagés avant la date limite de contractualisation – D+3 (198.776 €).
- Le taux de décaissement au 30 novembre 2023 est de 58,84 % (paiements de préfinancements et factures).
- La majorité (53,4 %) des fonds engagés concernent la composante 1 « Promouvoir des pratiques agricoles de qualité ».

Perspectives pour le prochain semestre (janvier à juin 2024)

Composante « Production agricole durable »

- Intensifier la mise en relation des prestataires de proximité avec les ménages agricoles accompagnés, afin d'anticiper le retrait des équipes opérationnelles à la fin des projets.
- Réflexion sur la stratégie de pérennisation du maintien du dynamisme des leaders.
- Echanges entre producteurs agricoles à Maurice et aux Seychelles et formations en techniques agroécologiques par Agrisud.
- Organisation d'un atelier pour stimuler les échanges de matériel végétal entre projets et pour la formation de formateurs à l'utilisation de l'application Nuru pour diagnostiquer les maladies du manioc, à l'initiative du projet BRECOMA.
- Développement des 3 radeaux finaux pour la culture d'algues à Maurice (janvier 2024).
- Début de la production de produits alimentaires à base d'algues, qui seront identifiés en fonction des goûts et des préférences locales.
- Poursuite des essais agroécologiques en milieu paysan (projet Food-Sec Semence).
- Poursuite des essais VATE sur les nouvelles variétés et création de fiches variétales spécifiques au projet Food-Sec Semence.
- Formation à l'utilisation des appareils LAMP pour réaliser les tests sanitaires aux Seychelles
- Le projet APTAE-OI poursuivra la construction de la base de données d'inventaire des pratiques agroécologiques et l'analyse critique des expériences de certification des produits dans la région OI.
- Analyse des performances agroéconomiques et environnementales des pratiques agroécologiques à partir de 2 cas à Maurice.
- Organisation de l'atelier champ école sur les pratiques agroécologiques à Maurice (3ème semaine de mars 2024).
- Le Vélo Vert est directement impliqué dans les activités du projet APTAE-OI et réalisera 10 capsules vidéo à destination des partenaires et publics de la région.

Composante « Nutrition / Diversification de l'alimentation »

- Renforcement des activités de sensibilisation, de suivi et d'accompagnement, avec en point de mire la durabilité des acquis et la viabilité des interventions.
- Mise en ligne d'une plateforme numérique sur la nutrition pour accompagner la sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles et organisation de divers événements de promotion des bonnes pratiques nutritionnelles (projet DAYIMA).
- Formation pour les acteurs locaux (ONG principalement) intervenant dans le domaine de l'agriculture aux Comores pour qu'ils puissent développer des activités agricoles sensibles à la nutrition (en discussion).
- Campagnes de communication et sensibilisation aux bonnes pratiques nutritionnelles aux Comores et à Maurice.

Composante « Sécurité sanitaire et phytosanitaire SPS »

- Comités de pilotage du projet Jumelage (COPIL5 le 11 janvier 2024 et COPIL6 en avril 2024).
- Séminaire régional d'échange de 3 jours sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ciblées et adaptées aux risques spécifiques identifiés, prévu pour février 2024 (AT CAPA).

- Six missions de renforcement des laboratoires par des actions de formation (validation de méthodes, accréditation, maintenance des équipements...), via l'instrument TAIEX et l'AT CAPA.

Composante « Systèmes d'informations SAN »

- Production de premières notes techniques, nationales et régionale, avec indicateurs de la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
- Sélection et contractualisation du prestataire et élaboration des plateformes nationales d'information, en commençant par celle de Maurice.
- Actions de renforcement des capacités pour la collecte des données, focalisées sur l'utilisation des outils digitaux et les méthodologies CAPI dans les 4 pays.
- Actions de renforcement des capacités pour la gestion et l'analyse des données : sur l'utilisation des outils d'analyse statistique (Stata) et pour l'apurement, la préparation des données en vue de leur harmonisation et leur intégration dans les plateformes. Des modules de renforcement de capacités dans les analyses SIG seront également dispensés aux Seychelles et à Madagascar.
- Appui régulier et renforcement des Task forces nationales.
- Elaboration d'une stratégie régionale d'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et établissement d'un plan de communication pour la diffusion d'information sur la sécurité alimentaire.

Pilotage, coordination, suivi-évaluation, communication

- Production des premières capsules vidéo sur les réalisations / bonnes pratiques du programme.
- Réalisation de missions de suivi et de coordination des activités par l'Assistant technique : visite de terrain des projets subvention Madagascar (février/mars et mai) et selon les nécessités : Comores et Seychelles.
- Organisation d'un atelier thématique pour favoriser le partage d'expériences entre opérateurs en faveur d'une meilleure prise en compte de la nutrition dans les projets de développement agricole (probablement à Madagascar).
- Préparation du second cycle de l'enquête de recherche évaluative NRF (enquête endline prévue durant la période septembre – octobre 2024)

La 4^{ème} réunion du Comité de Suivi Opérationnel est prévue début 2025, en présentiel probablement à Madagascar, avec organisation d'un événement thématique en préparation de la clôture du programme SANOI.

Commission de l'océan Indien

Blue Tower, 3^{ème} étage, rue de l'Institut
Ebène, Maurice

T (+230) 402 61 00

commissionoceanindien.org

 Commission de l'océan Indien - Indian Ocean Commission
 @commission_coi
 Indian Ocean Commission

Délégation de l'Union européenne auprès de la République de Maurice et de la République des Seychelles

8^e étage, St. James Court, St Denis Street
PO Box 1148, Port Louis, Maurice

T (+230) 207 15 15

delegation-mauritius@eeas.europa.eu
eeas.europa.eu/mauritius



Nourrir durablement l'Indianocéanie
